

Helseplattformen- Innføring i HMR

Kirsti Margrethe Hamar, Lokal innføringsprosjekt leder Helse Møre og Romsdal

15. September 2023



EN SAMHANDLINGSPLATTFORM FOR HELE MIDT-NORGE

225 dager til Go-Live

Helse Møre og Romsdal HF

Status for Lokalt innføringsprosjekt Helseplattformen HMR



OVERORDNET STATUS

I henhold til plan

Lokalt prosjektet er på plan, det jobbes godt og fremdriften er tilfredsstillende. Arbeidet med detaljplanlegging fortsetter og spesielt arbeidet med å forberede ny arbeidsflyt og nye prosesser i Helse Møre og Romsdal.

NESTE MILEPÆLER

EUD - Uke 39

Utplassering av utstyr

Opplæring - Uke 39

Rekruttert riktig antall instruktører

Opplæring - Uke 40

Påmelding av ansatte på kurs



FREMDRIFT

I rute

Det jobbes godt med å planlegge innføringsaktiviteter samt å få innsikt i hvilke tilpasninger av løsningen som er nødvendig for HMR. Påmelding av ansatte til kurs og utplasseringen av utstyr pågår.



ØKONOMI

Prognose under budsjett

Prognose under budsjett for 2023.



RISIKO

Risiko bør overvåkes

HMR blir det andre foretaket som vil ta løsningen i bruk, løsningen må være tilstrekkelig tilpasset HMR og retting av kritiske feil må være fullført. Opplæringsmateriellet må være viderutviklet og oppdatert.



RESSURSER

Noe problematisk

Vi ser slitasje ved at prosjektet drar ut i tid. HMR har nå et lavere antall fageksperter enn ved prosjektets start, da flere har sluttet. Har også utfordringer med å få rekruttert tilstrekkelig med instruktører.




GEVINST


I henhold til plan

Det planlegges aktiviteter ut i klinikkene til høsten.

Lokalt innføringsprosjekt HP HMR 2023

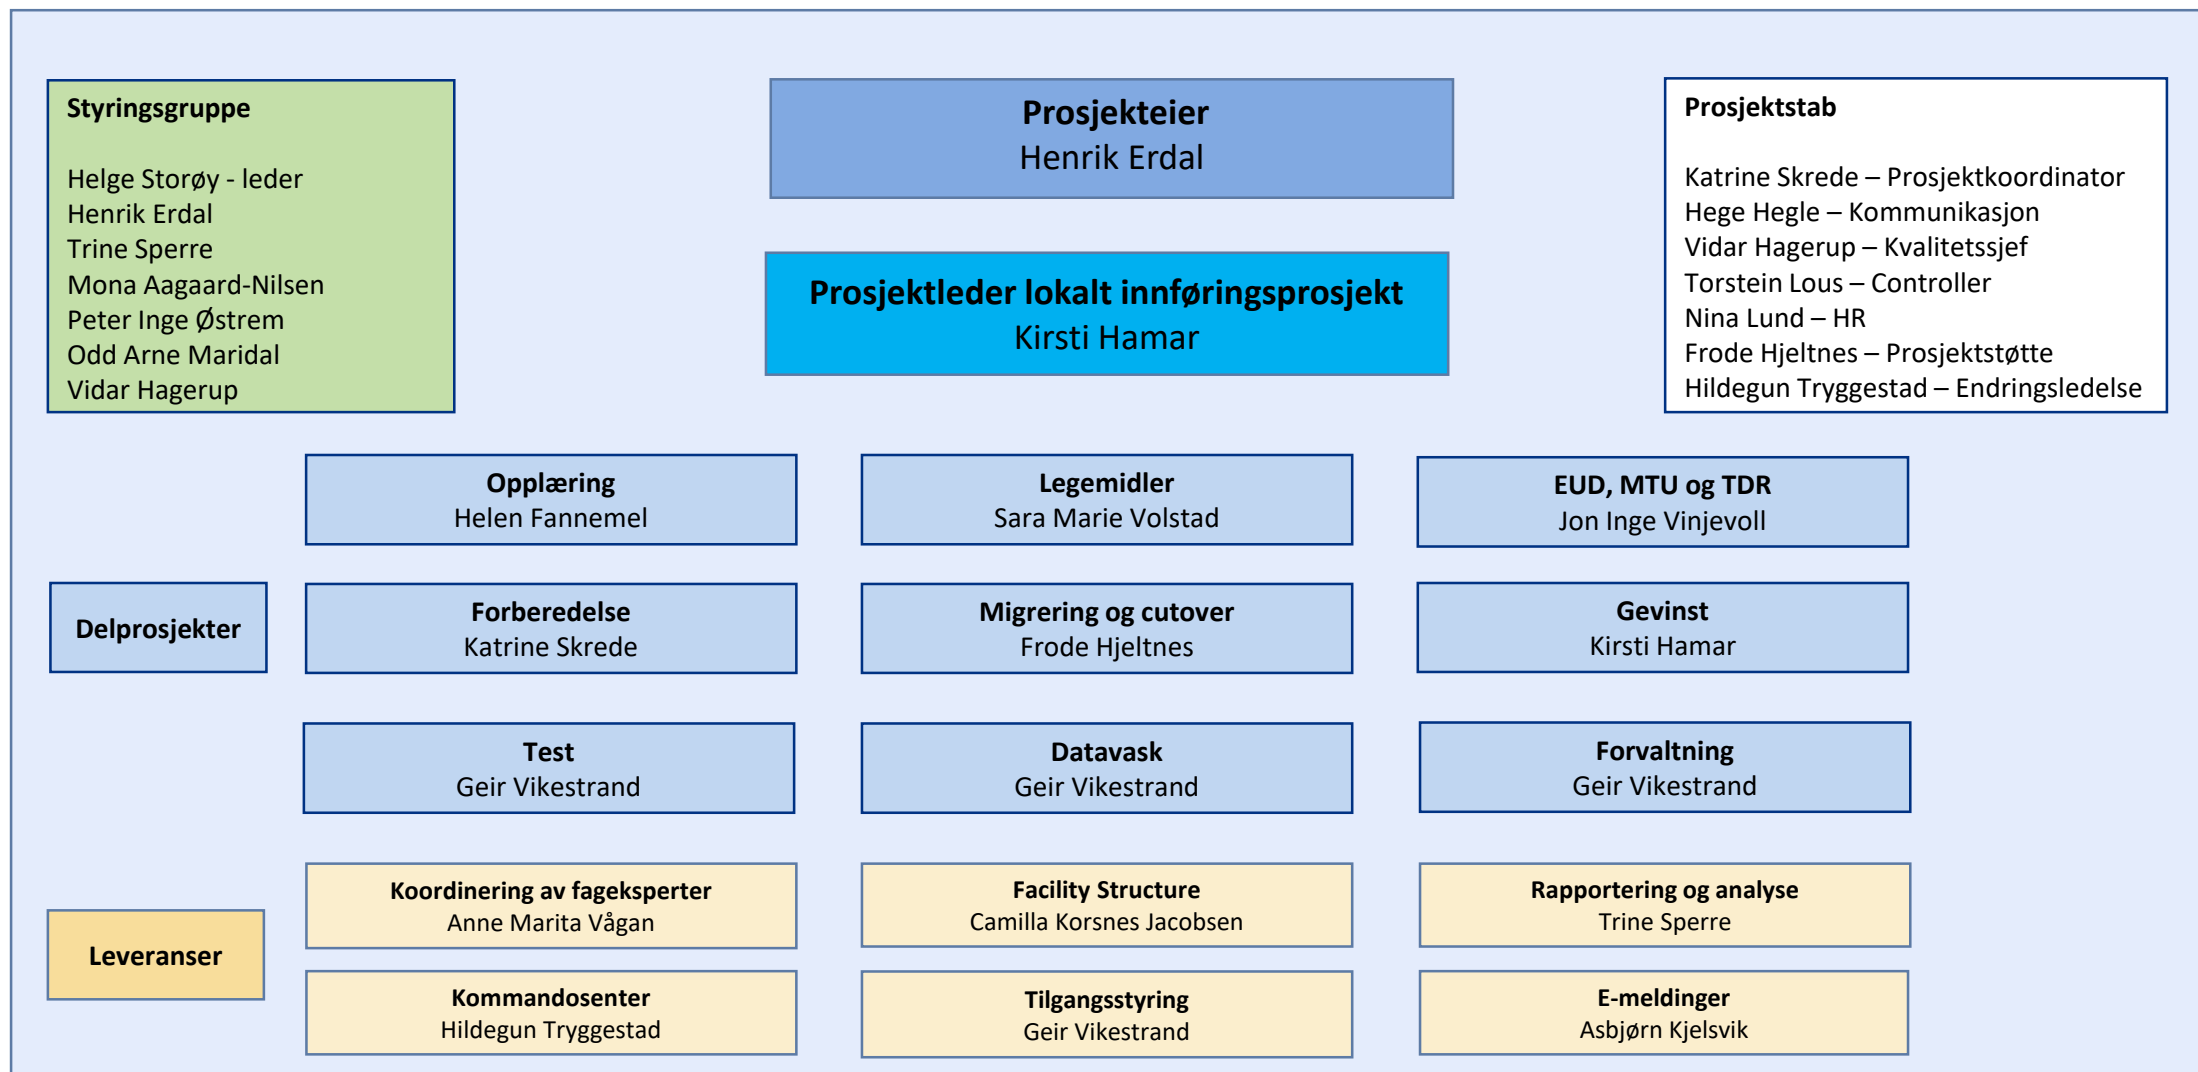

Tidslinje i HMR

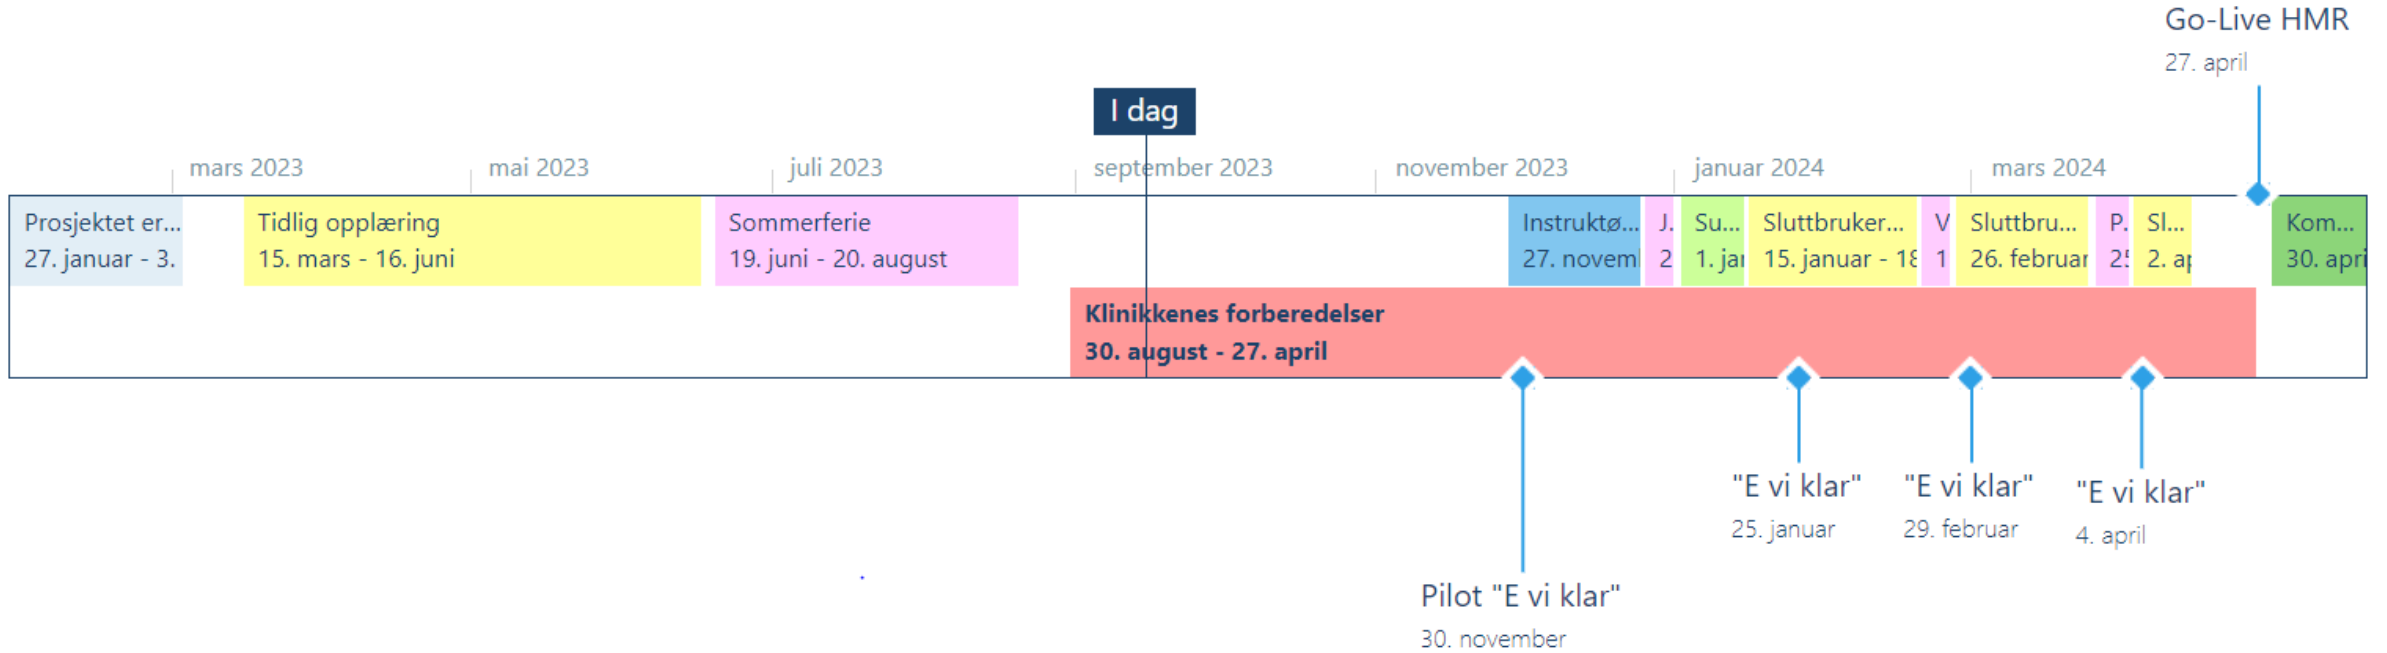

Tidslinje for opplæring i HMR




48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Instruktøropplæring				Juleferie	Superbrukeropplæring			Sluttbrukeropplæring				Vinterferie	Ålesund Kr.Sund			Påskeferie			Buffer	Buffer	Go-Live	Kommandosenter- periode HMR	
													Sluttbrukeropplæring Volda og Molde										

	Instuktøropplæring
	Superbrukeropplæring
	Sluttbrukeropplæring

	Ålesund sykehus
	Kristiansund sykehus
	Volda sykehus
	Molde sykehus

Hovedaktiviteter haust/vinter 2023

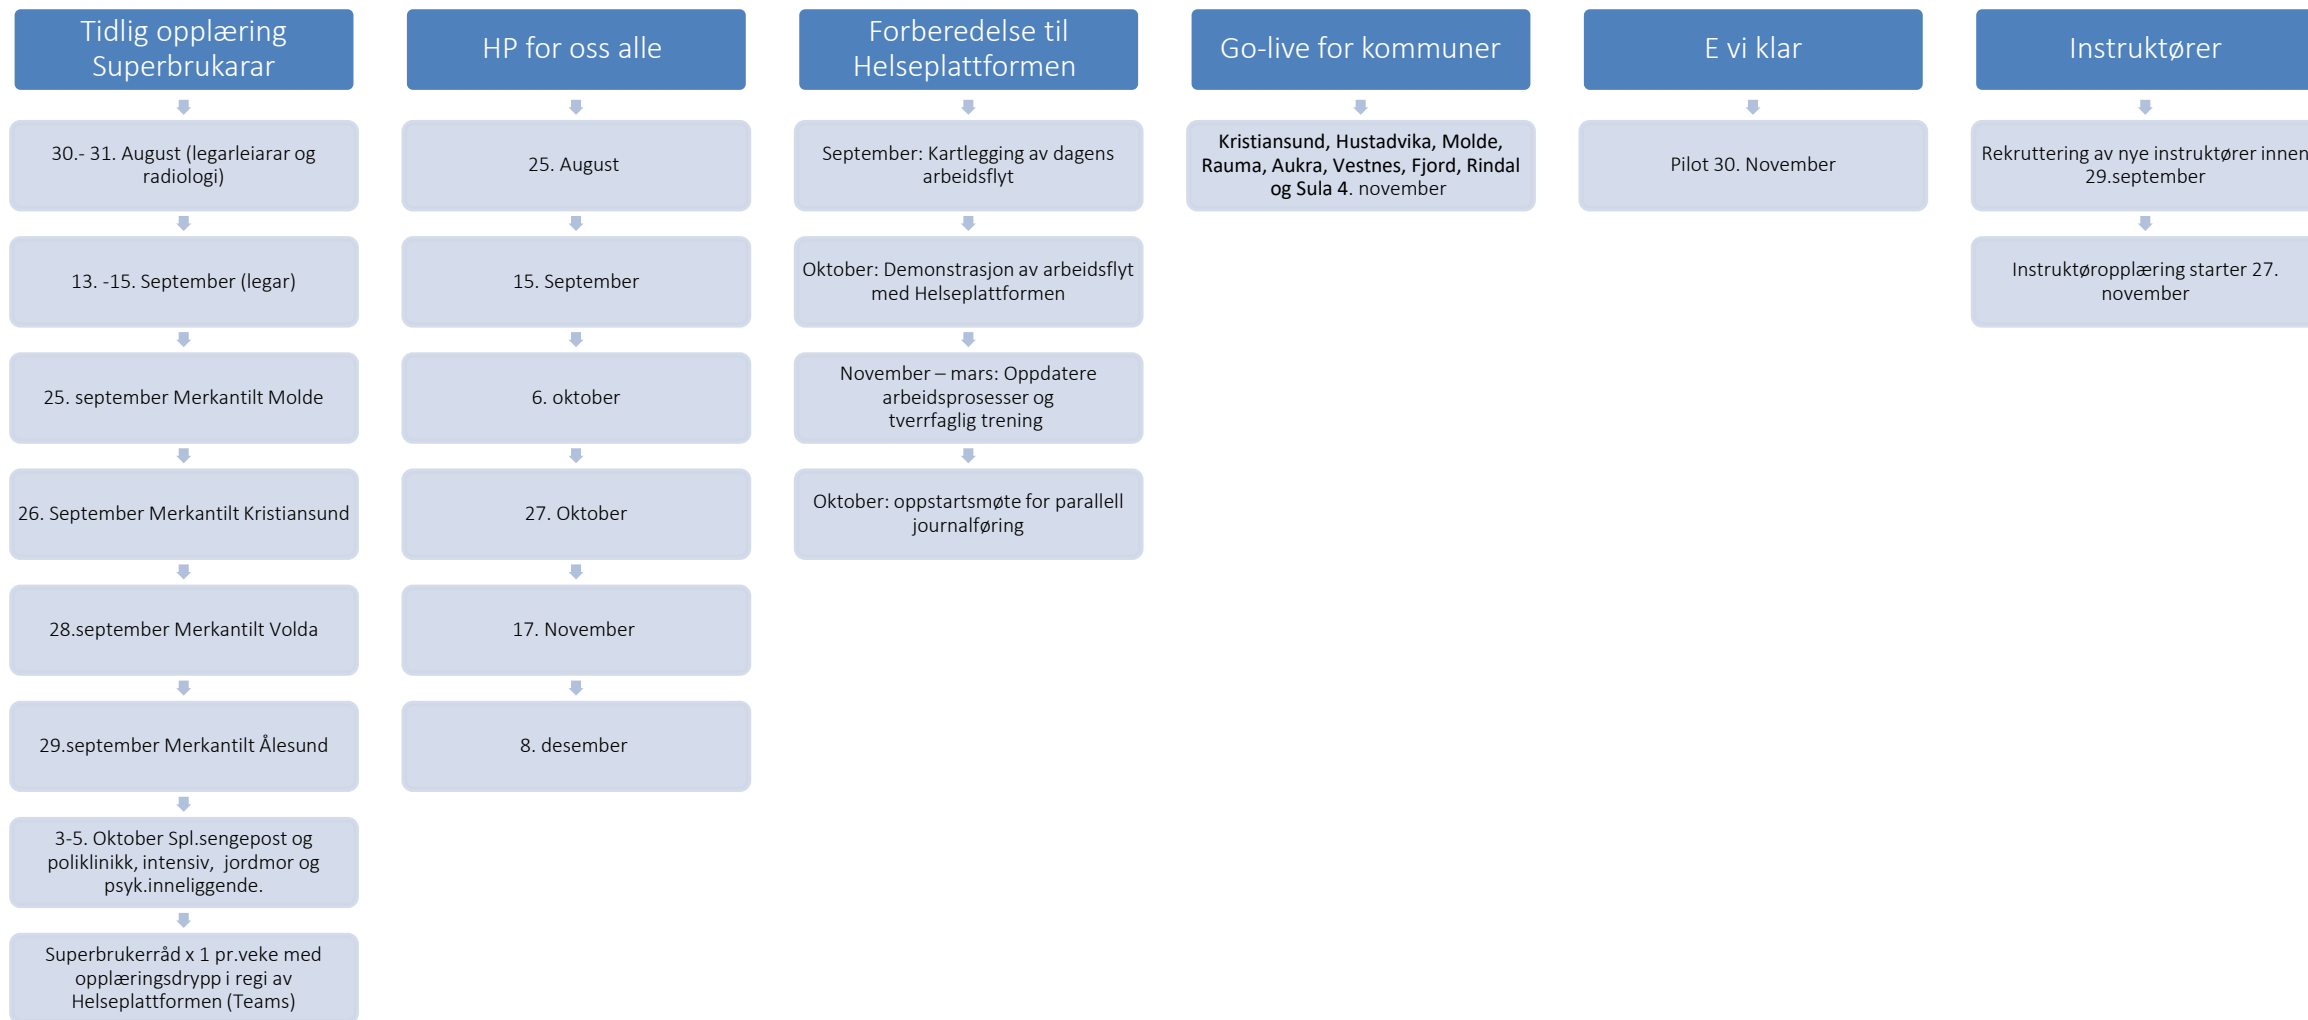



Oppgaver til ledere

- 6. Oktober frist for påmelding av ansatte på kurs
- Bruk Kompetanseplan og sjekklister for ledere "**Forberedelse til Helseplattformen**" aktivt
- Turnusplanlegging for opplæringsperioden

Møter

- Oppstartsmøte for parallell journalføring 02.10.23
- 6. Oktober **HP for oss alle**
- 5. og 26. Oktober **Supebrukerråd**

Aktiviteter

- 2. Oktober arbeidsmøter for rydding i PAS i Molde
- 3. Oktober arbeidsmøter for rydding i PAS i Ålesund
- 4. Oktober arbeidsmøter for rydding i PAS i Ålesund
- 5. Oktober arbeidsmøter for rydding i PAS i Volda
- 3-5. Oktober tidlig kurs for Superbrukere spl.sengepost og poliklinikk, intensiv, jordmor og psykiatrisk inneliggende
- Demonstrasjon ny arb.flyt i regi av Helseplattformen i uke 42 og 44

Gevinstmål for spesialist- og kommunehelsetjenesten



Spesialisthelsetjenesten



Pasientmedvirkning



Brukervennlighet



Legemiddelhåndtering



Digital hjemmeoppfølging



Forskning



Styringsinformasjon



Samhandling og pasientlogistikk



Kvalitetsregistre

Kommunehelsetjenesten



Innbyggerinvolvering



Brukervennlighet



Legemiddelhåndtering



Digital hjemmeoppfølging



Forskning



Styringsinformasjon



Logistikk



Samhandling



225 DAGER TIL GO-LIVE
